令和元年度　多摩清掃工場敷地境界における空間放射線量率測定結果

単位：μSv/h

測定日		敷地境界（高さ１ｍの点）			
		工場北側（P-1）	工場東側（P-2）	工場南側（P-3）	工場西側（P-4）
		尾根幹線側	総合福祉センター側	多摩清掃工場正門側	小田急車庫側
2019/4/5	（1回目）	0.08	0.07	0.08	0.09
2019/4/12	（2回目）	0.07	0.08	0.08	0.09
2019/4/19	（3回目）	0.07	0.08	0.08	0.09
2019/4/26	（4回目）	0.07	0.07	0.09	0.10
2019/5/6	（5回目）	0.07	0.07	0.07	0.10
2019/5/10	（6回目）	0.07	0.08	0.08	0.09
2019/5/17	（7回目）	0.07	0.07	0.07	0.08
2019/5/24	（8回目）	0.07	0.08	0.08	0.09
2019/5/31	（9回目）	0.07	0.08	0.07	0.09
2019/6/7	（10回目）	0.06	0.07	0.07	0.08
2019/6/14	（11回目）	0.07	0.07	0.08	0.08
2019/6/21	（12回目）	0.06	0.07	0.08	0.09
2019/6/28	（13回目）	0.07	0.07	0.08	0.09
2019/7/5	（14回目）	0.07	0.07	0.09	0.09
2019/7/12	（15回目）	0.07	0.07	0.08	0.09
2019/7/19	（16回目）	0.07	0.08	0.08	0.09

測定機器：日立アロカメディカル㈱製 TCS-172B（エネルギー補償型シンチレーション式サーベイメータ）
測定方法：指示値の安定を確保した後（90秒）、指示値を30秒ごとに５回を読み取り、その平均を測定値とした。
※ 測定値は、当組合工場職員の測定によるものです。
※ 測定値は気象条件等により変化します。
※ 敷地境界は地上高さ1mの距離での測定結果です。

測定地点図

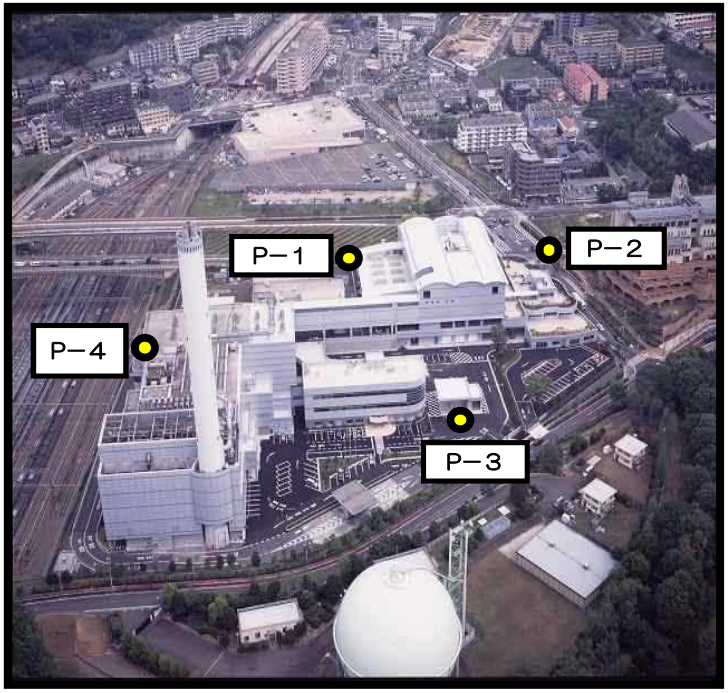

（参考）P-3での自主測定の様子
