令和4年度　多摩清掃工場運転計画

運転計画の基本的考え方
1，一炉当たりのごみ焼却量は、200t/日±10%とする。
2，焼却炉立上げ・立ち下げの焼却量は100t/日として、焼却炉稼働日にカウントする。
3，ごみ貯留可能量は、原則4500t以下とする。
4，11月から3月に定期補修工事を行う。共通系整備期間は約30日間とする。（立ち上げ・立ち下げは、定期補修工事日数に含む。）

2021/8/27

		4月						5月						6月						7月						8月						9月					
		1	6	11	16	21	26	1	6	11	16	21	26	1	6	11	16	21	26	1	6	11	16	21	26	1	6	11	16	21	26	1	6	11	16	21	26
2号炉				炉清掃																4 ←																	
1日当たり焼却量	t/日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
月焼却量　計	t/月						0						0						0						5,500						6,200						6,000
3号炉		←→ 4				21 ←														→ 5																	
1日当たり焼却量	t/日	185	0	0	0	100	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
月焼却量　計	t/月						2,465						5,890						5,700						900						0						0
1日当たり焼却量	t/日	185	0	0	0	100	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
月合計焼却量	t/月						2,465						5,890						5,700						6,400						6,200						6,000
想定搬入量	t/月			5,632						5,897						5,440						5,771						5,470						5,385			
搬入日平均	t/日						268						268						247						275						238						245
ピット残	t	1084	1416	2392	3296	4267	4342	3977	4312	4164	4134	4033	4126	4026	4021	3950	4011	4029	3663	3990	3612	3612	3538	3635	3686	3473	3275	3225	3150	2670	2859	2616	2552	2085	2309	2041	1931
ピット残（実績）		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		10月						11月						12月						1月						2月						3月						合計
		1	6	11	16	21	26	1	6	11	16	21	26	1	6	11	16	21	26	1	6	11	16	21	26	1	6	11	16	21	26	1	6	11	16	21	26	
2号炉		→ 4		炉清掃												機器補修工事（オーバーホール・炉清掃含む）								機器補修工事 共通関係			6 ←										→	稼働日数 147 日
1日当たり焼却量	t/日	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	
月焼却量　計	t/月						700						0						0						0						4,390						6,045	28,835
3号炉		3 ←																				13 →	炉清掃					機器補修工事（オーバーホール・炉清掃含む）										稼働日数 183 日
1日当たり焼却量	t/日	0	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	185	185	185	185	185	185	185	185	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
月焼却量　計	t/月						5,420						5,700						5,735						2,320						0						0	34,130
1日当たり焼却量	t/日	200	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	185	185	185	185	185	185	185	185	185	0	0	0	0	100	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	
月合計焼却量	t/月						6,120						5,700						5,735						2,320						4,390						6,045	62,965
想定搬入量	t/月			5,542						5,253						5,661						5,157						4,543						5,411				65,163
搬入日平均	t/日						264						239						270						258						227						235	253
ピット残	t	1755	1619	1658	1241	1569	1408	1471	1080	1362	1126	1083	976	989	1068	676	1045	926	927	671	854	700	1172	1859	2798	3732	4459	4250	4182	4076	3596	3692	3612	3468	3452	3397	2973	
ピット残（実績）		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

想定搬入量	65,163	t/年	焼却施設稼働日数	326	日		7～9月		それ以外	
2号炉焼却量	28,835	t/年	2号炉稼働日数	147	日	2炉運転日数	2	日	2	日
3号炉焼却量	34,130	t/年	3号炉稼働日数	183	日	1炉運転日数	90	日	232	日
合計焼却量	62,965	t/年				全炉停止日数	0	日	39	日
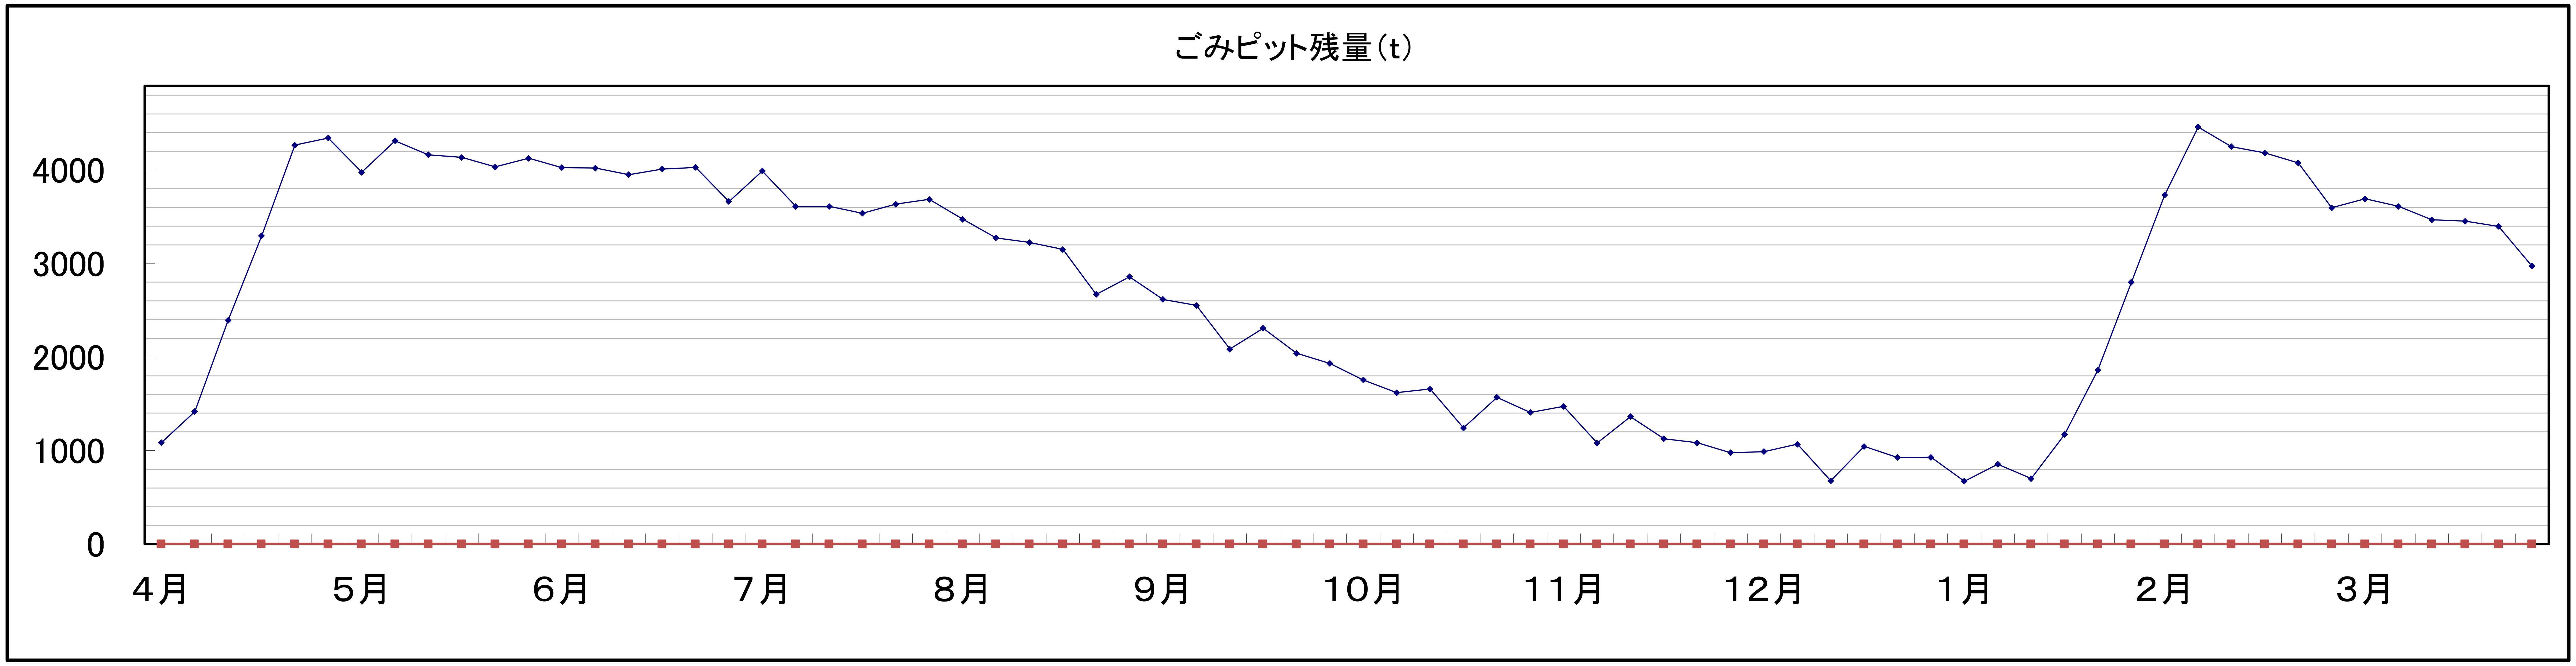
～焼却炉立ち下げ・立下げについて～	
立ち上げ	立ち下げ
・0:00　焼却炉起動	・17:00　焼却炉停止
・12:00　余熱利用熱供給開始	・24:00　余熱利用熱供給停止
